

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 61, BRNO - VÝMĚNA ZASTŘEŠENÍ ATRIA II

Místo stavby: BRNO

Část: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Objednatel: Ing. Martin Němec, Podveská 14; 624 00 Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1; 601 67 Brno

# VYJÁDŘENÍ KE STAVU STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ

Dokumentace pro realizaci stavby

Dokument číslo: 2019-014-001

Vypracoval: Miroslav Honců  
Aut. Ing. pro statiku a dynamiku staveb  
ČKAIT - 1005370

Datum vypracování: 10.6.2019

Datum tisku: 18.7.2019








Počet stran: 5

## 1. ÚVOD

Předmětem tohoto dokumentu je statické zhodnocení stávajícího stavu komínů.

## 2. POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

Zaslané fotografie ze stavby.

	IMG_4179.jpeg	10.6.2019 14:40	Obrázek JP...	136 kB
	IMG_4181.jpeg	10.6.2019 14:42	Obrázek JP...	143 kB
	IMG_6383.jpeg	10.6.2019 14:40	Obrázek JP...	101 kB
	IMG_6384.jpeg	10.6.2019 14:42	Obrázek JP...	109 kB
	IMG_6385.jpeg	10.6.2019 14:42	Obrázek JP...	115 kB
	IMG_6386.jpeg	10.6.2019 14:42	Obrázek JP...	118 kB
	IMG_6387.jpeg	10.6.2019 14:42	Obrázek JP...	107 kB

Volně dostupné informace na internetu.

Mapy – seznam.cz

### 3. POPIS KONSTRUKCE:

Jedná se o části komínů vystupujících nad rovinu střechy – viz foto.  
Na fotografiích je jasně vidět havarijní stav dvou komínů.

Foto 1

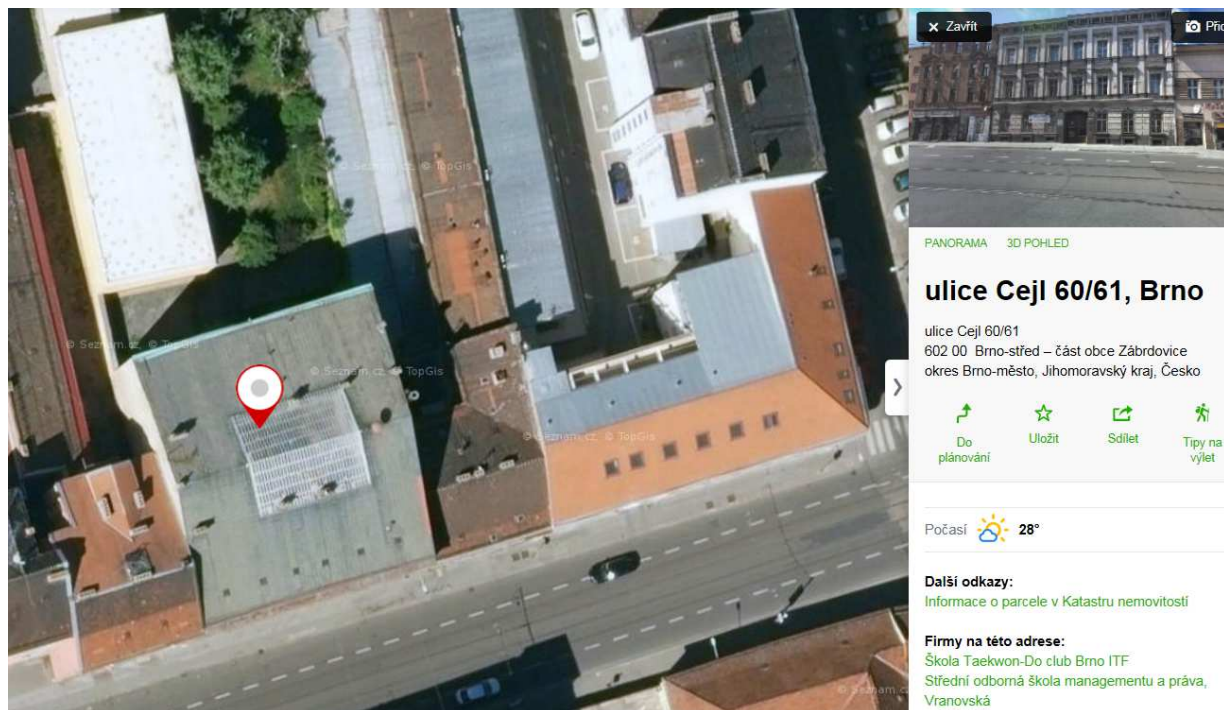


Foto 2



Vyzdívky stěn komínů se drolí, malta vypadává, komínové tělesa jsou částečně prasklá.

## 4. UMÍSTĚNÍ KOMÍNŮ



Červeně ... foto 1

Žlutě ... foto 2

## 5. DOPORUČENÍ

Dle poskytnutých fotografií jsou komíny na foto 1 a 2 v havarijním stavu.

Při případné destrukci komíny svou polohou ohrožují veřejně přístupné plochy po stranách budovy.

Doporučuji oba komíny po částech odbourat na výšku cca.200mm nad rovinu střechy.

V případě, že jsou komíny funkční, pak je během navrhovaných stavebních úprav postavit znovu, v případě, že funkční nejsou, pak je během provádění navrhovaných stavebních úprav odbourat až pod střechu a střechu doplnit krytinou.

Při bourání dodržovat požadavky BOZP, hlavně uzavřít volně přístupný prostor (chodník).

V Lažánkách 10.6.2019

Ing. M Honců
