



1 . STAVBA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA A NAVAZUJÍCÍ STAVBY BVV ZÁPAD

Prezentace projektu PDPS

14.01.2022




1. STAVBA (Komunikace, plochy a inženýrské sítě)

- MSKP 1. ETAPA
- Vybrané objekty MSKP 2. ETAPA
- Vybrané SO/IO Smyčka Lipová
- Vybrané objekty Lanová dráha

ROZDĚLENÍ ETAP VÝSTAVBY:

- MSKP A OKOLNÍ PLOCHY HALY + LANOVÁ DRÁHA
- OKOLNÍ PLOCHY (MSKP 2. ETAPA) + VMO BAUEROVA
- SMYČKA TT LIPOVÁ

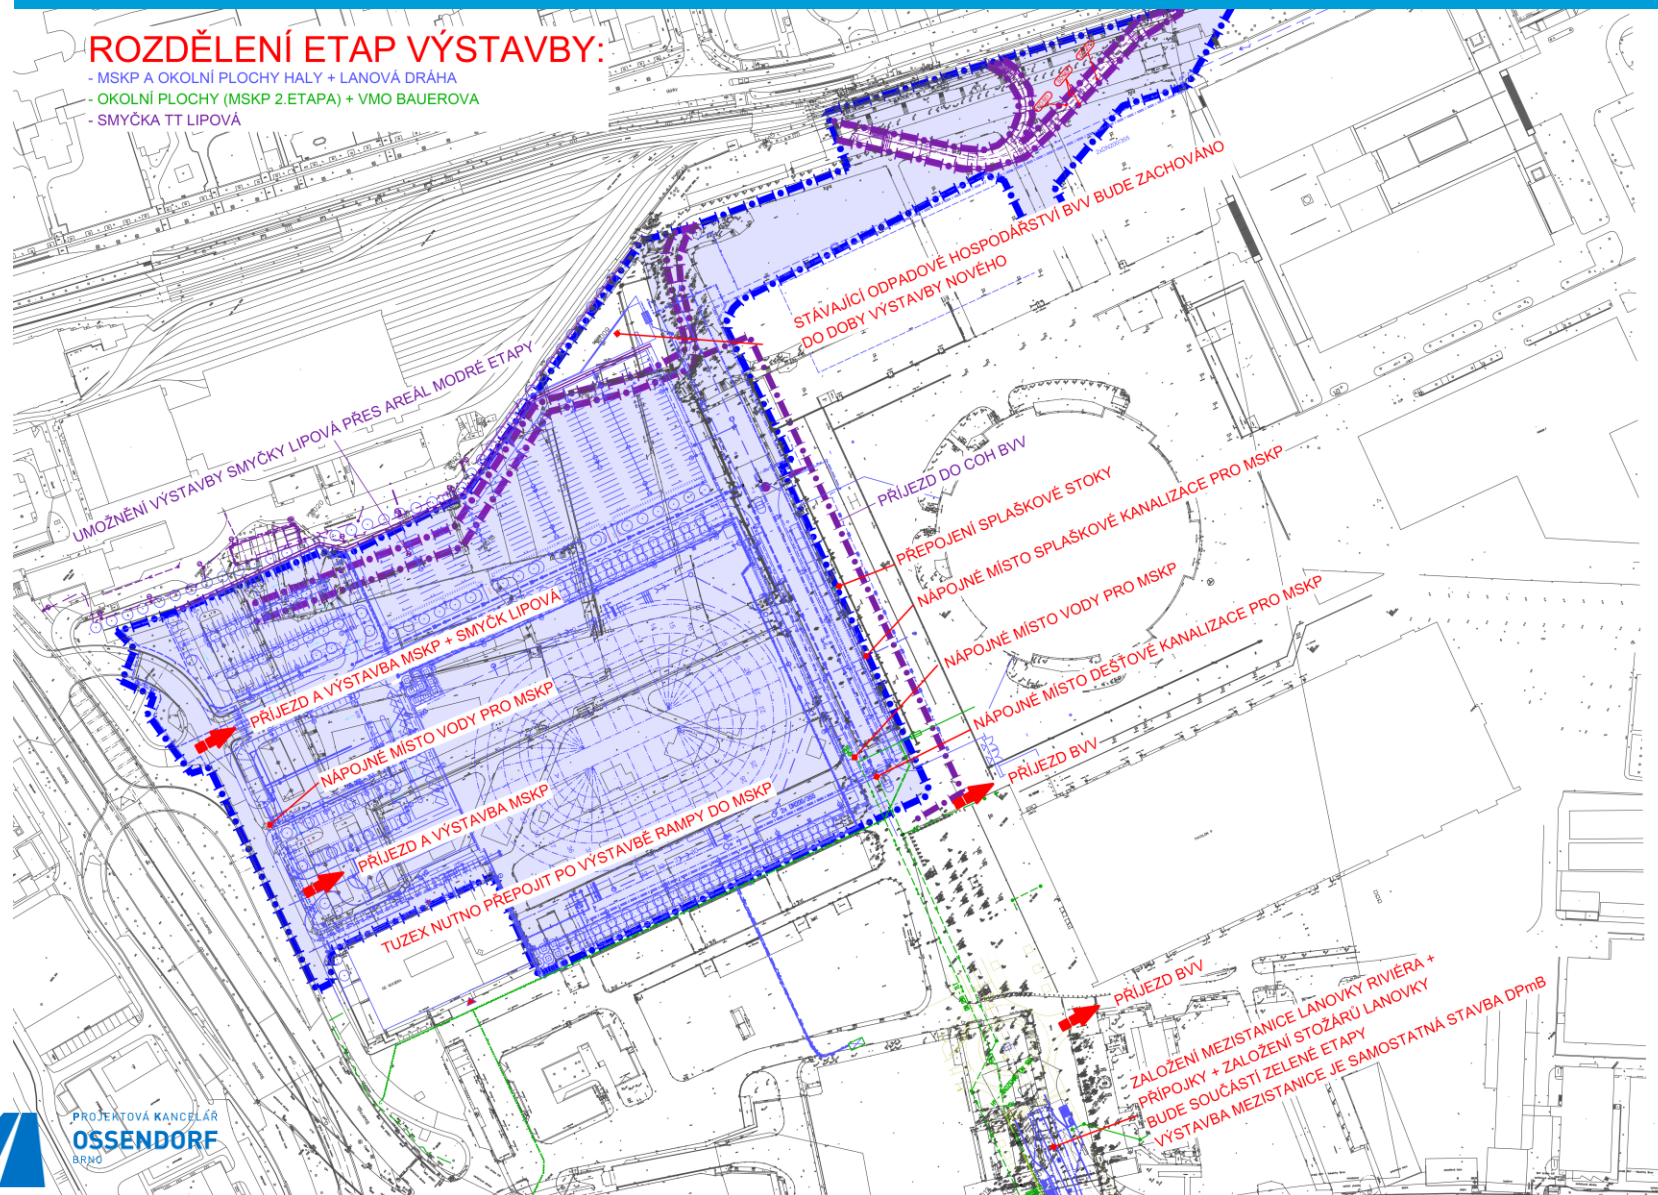


ČASOVÁ KOORDINACE STAVEB BVV ZÁPAD 2022 - 2024

- MENDLOVO NÁMĚSTÍ
- PPO ÚSEK ZVONAŘKA – FAVORIT
- VMO ŽABOVŘESKÁ
- I/23 BÍTEŠSKÁ – VO, POVRCH TUNEL – D1
- COH BVV

VAZBY V LOKALITĚ

- VMO BAUEROVA – VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ SP 04-06/2022
- DOKONČENÍ S VMO ŽABOVŘESKÁ
- COH BVV
- VOZOVNA III. ETAPA – VYDÁNÍ SP ZAHÁJENÍ STAVBY
 - OVLIVŇUJE DOKONČENÍ MODRÉ ETAPY – STYK DVOU STAVEB
 - STAVBA MUSÍ OPUSTIT „MODROU PLOCHU“ TAK, ABY „MODRÁ“ MOHLA PLOCHY DOKONČIT S HALOU
- HALA + PLOCHY – KOMPLETNÍ VYDÁNÍ SP PLOCH 03/2022
- ZAHÁJENÍ STAVBY 2022
- PPO – OMEZENÍ DOPRAVY VMO

AKTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ STAVBY BVV Západ

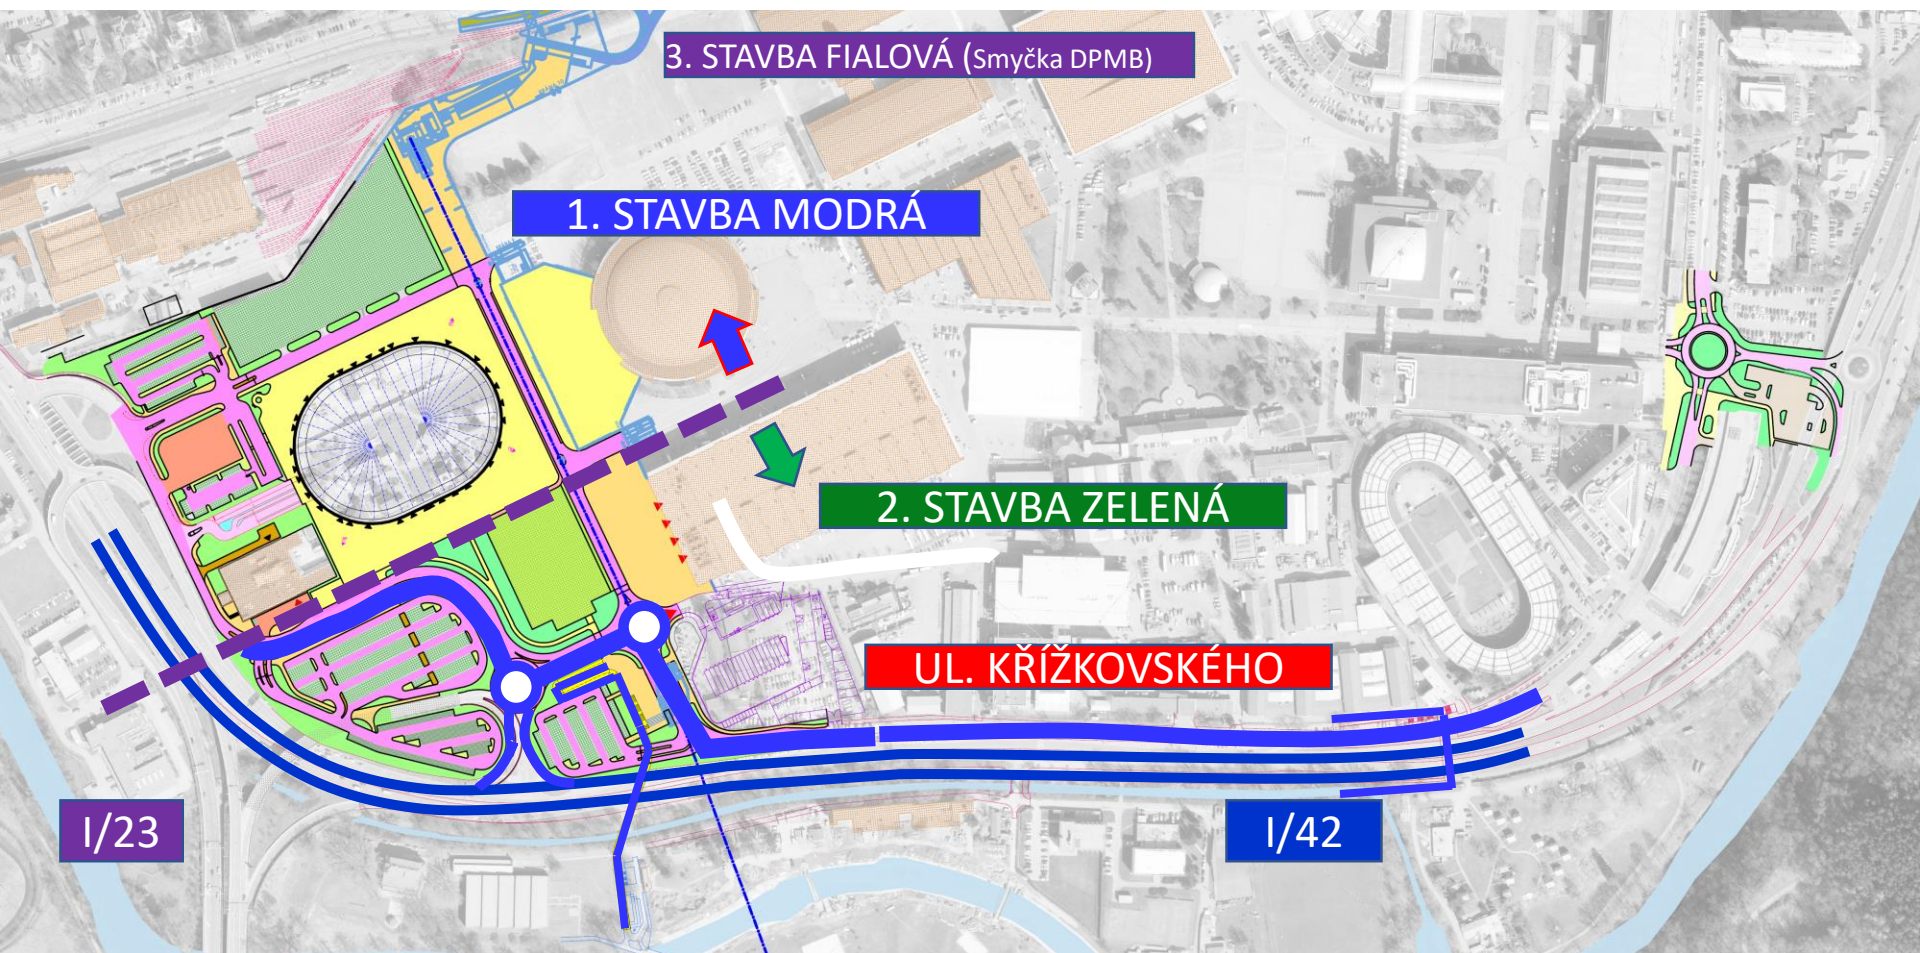

DOPRAVNÍ OMEZENÍ PŘEPRAVNÍ TRASY PRO STAVENIŠTNÍ DOPRAVU A BVV

(I/42 VMO Brno, Bauerova + MSKP 2. ETAPA + Smyčka)

VAZBY

PŘÍJEZD + VÝJEZD VOZIDEL:

- VOZOVNA III. ETAPA
- HALA, COH, BVV

VELODROM + ČSPH NAPOJENY NA
UL. KŘÍŽKOVSKÉHO
BVV, TUZEX – OMEZENÍ NAPOJENÍ
MHD – BEZ ZASTAVENÍ – MOŽNÁ
ZASTÁVKA U RIVIERY SMĚR NA MN
– OTÁZKA OBSLUHY RIVIERY

PŘÍJEZD VOZIDEL STAVBY VMO + BVV
